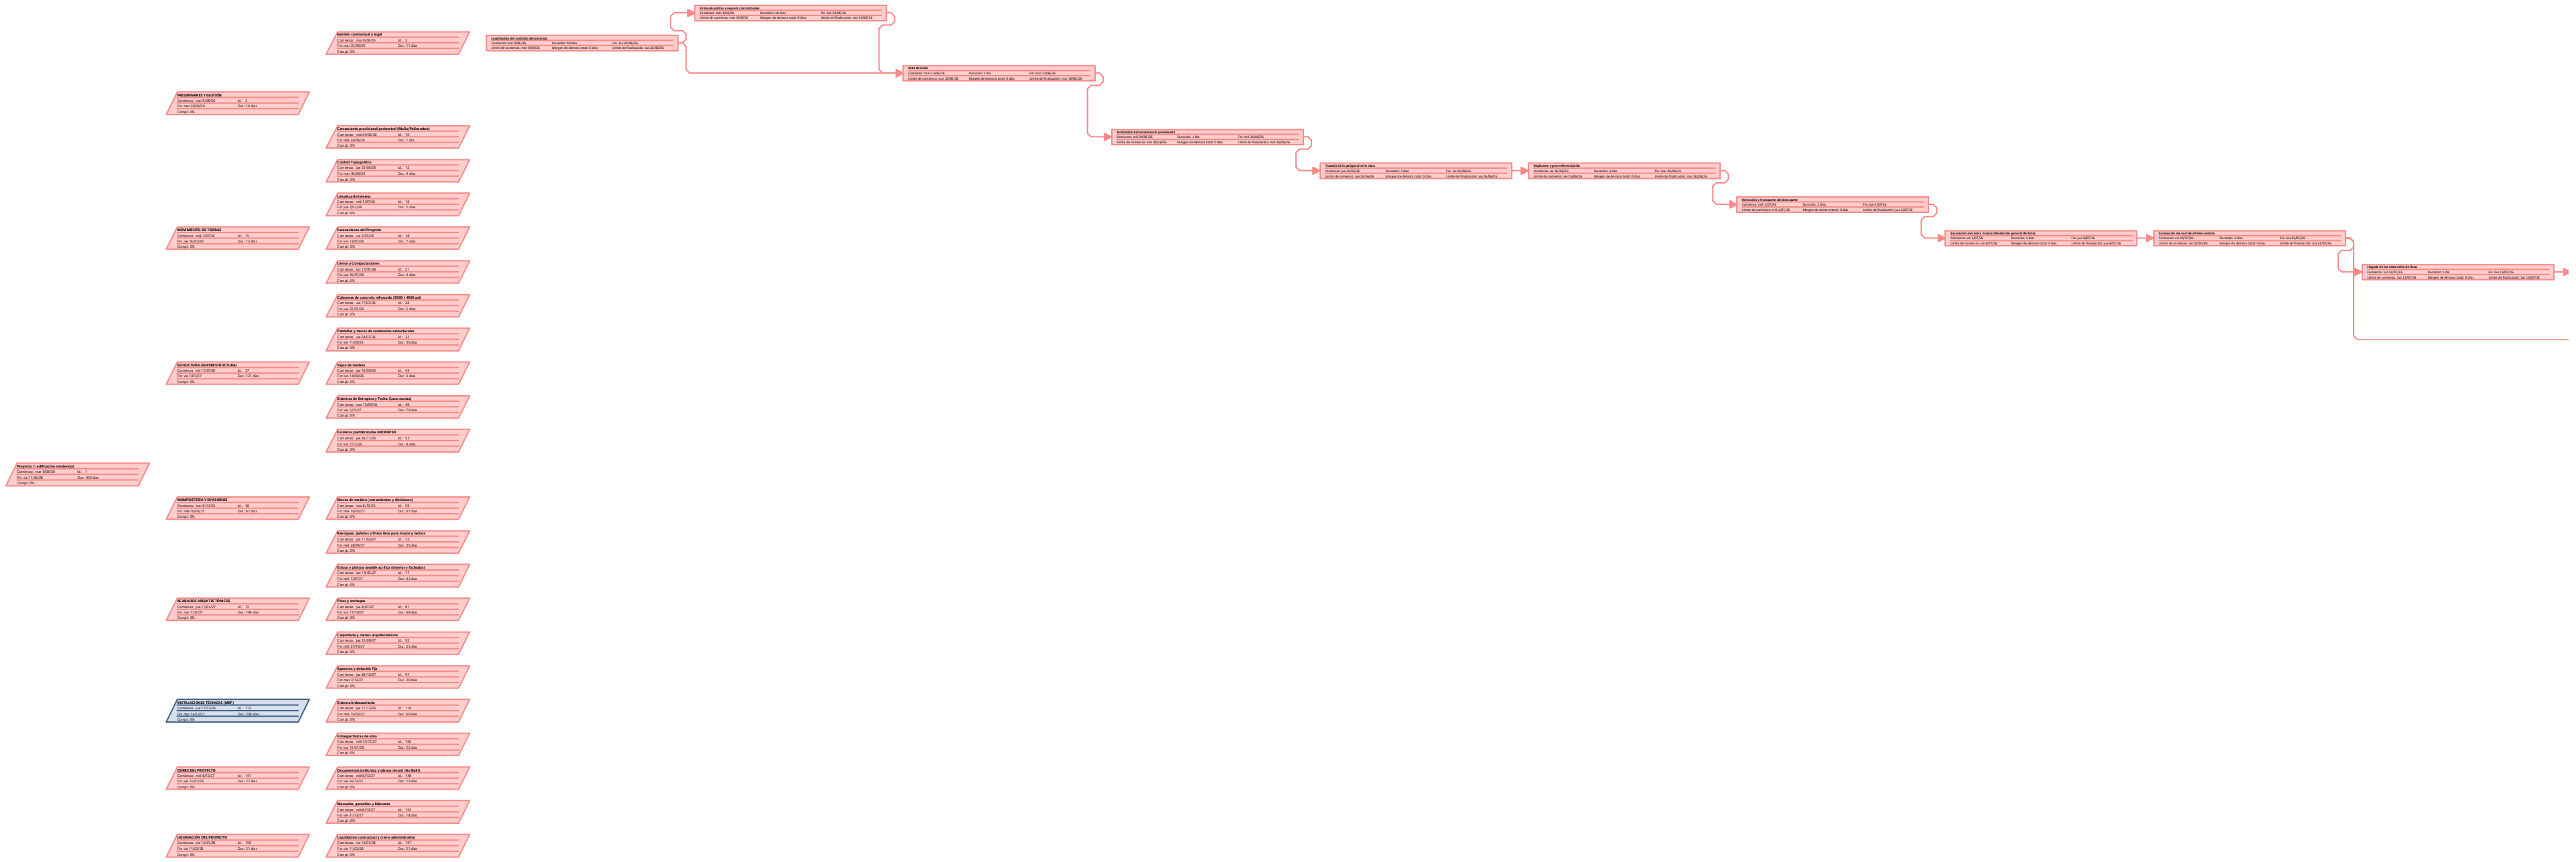
Proyecto 1: edificación residencial
Comienzo: mar 9/06/26 Id.: 1
Fin: vie 11/02/28 Dur.: 439 días
Compl.: 0%
PRELIMINARES Y GESTIÓN
Comienzo: mar 9/06/26 Id.: 2
Fin: mar 30/06/26 Dur.: 16 días
Compl.: 0%
Gestión contractual y legal
Comienzo: mar 9/06/26 Id.: 3
Fin: mar 23/06/26 Dur.: 11 días
Compl.: 0%
Legalización del contrato del personal
Comienzo: mar 9/06/26 Duración: 10 días Fin: lun 22/06/26
Límite de comienzo: mar 9/06/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: lun 22/06/26
Firma de polizas y seguros contractuales
Comienzo: mar 9/06/26 Duración: 10 días Fin: lun 22/06/26
Límite de comienzo: mar 9/06/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: lun 22/06/26
Acta de inicio
Comienzo: mar 23/06/26 Duración: 1 día Fin: mar 23/06/26
Límite de comienzo: mar 23/06/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mar 23/06/26
Instalación del cerramiento provisional
Comienzo: mié 24/06/26 Duración: 1 día Fin: mié 24/06/26
Límite de comienzo: mié 24/06/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mié 24/06/26
Trazado de la poligonal en la obra
Comienzo: jue 25/06/26 Duración: 2 días Fin: vie 26/06/26
Límite de comienzo: jue 25/06/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: vie 26/06/26
Replanteo ygeorreferenciación
Comienzo: vie 26/06/26 Duración: 3 días Fin: mar 30/06/26
Límite de comienzo: vie 26/06/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mar 30/06/26
Remoción y transporte del descapote
Comienzo: mié 1/07/26 Duración: 2 días Fin: jue 2/07/26
Límite de comienzo: mié 1/07/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: jue 2/07/26
Excavación mecánica masiva (Nivelación general del lote)
Comienzo: vie 3/07/26 Duración: 5 días Fin: jue 9/07/26
Límite de comienzo: vie 3/07/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: jue 9/07/26
Excavación manual de últimos metros
Comienzo: vie 10/07/26 Duración: 2 días Fin: lun 13/07/26
Límite de comienzo: vie 10/07/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: lun 13/07/26
Llegada de los materiales de lleno
Comienzo: lun 13/07/26 Duración: 1 día Fin: lun 13/07/26
Límite de comienzo: lun 13/07/26 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: lun 13/07/26
Cerramiento provisional perimetral (Malla/Polisombra)
Comienzo: mié 24/06/26 Id.: 10
Fin: mié 24/06/26 Dur.: 1 día
Compl.: 0%
Control Topográfico
Comienzo: jue 25/06/26 Id.: 12
Fin: mar 30/06/26 Dur.: 4 días
Compl.: 0%
Limpieza de terreno
Comienzo: mié 1/07/26 Id.: 16
Fin: jue 2/07/26 Dur.: 2 días
Compl.: 0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo: mié 1/07/26 Id.: 15
Fin: jue 16/07/26 Dur.: 12 días
Compl.: 0%
Excavaciones del Proyecto
Comienzo: vie 3/07/26 Id.: 18
Fin: lun 13/07/26 Dur.: 7 días
Compl.: 0%
Llenos y Compactaciones
Comienzo: lun 13/07/26 Id.: 21
Fin: jue 16/07/26 Dur.: 4 días
Compl.: 0%
Columnas de concreto reforzado (3000 / 4000 psi)
Comienzo: vie 17/07/26 Id.: 28
Fin: jue 23/07/26 Dur.: 5 días
Compl.: 0%
Pantallas y muros de contención estructurales
Comienzo: vie 24/07/26 Id.: 33
Fin: vie 11/09/26 Dur.: 36 días
Compl.: 0%
ESTRUCTURA (SUPERESTRUCTURA)
Comienzo: vie 17/07/26 Id.: 27
Fin: vie 1/01/27 Dur.: 121 días
Compl.: 0%
Vigas de madera
Comienzo: jue 10/09/26 Id.: 43
Fin: lun 14/09/26 Dur.: 3 días
Compl.: 0%
Sistemas de Entrepiso y Techo (Losa maciza)
Comienzo: mar 15/09/26 Id.: 46
Fin: vie 1/01/27 Dur.: 79 días
Compl.: 0%
Escaleras prefabricadas ENTREPISO
Comienzo: jue 26/11/26 Id.: 53
Fin: lun 7/12/26 Dur.: 8 días
Compl.: 0%
MAMPOSTERÍA Y DIVISORIOS
Comienzo: mar 8/12/26 Id.: 58
Fin: mié 10/03/27 Dur.: 67 días
Compl.: 0%
Muros de madera (cerramientos y divisiones)
Comienzo: mar 8/12/26 Id.: 59
Fin: mié 10/03/27 Dur.: 67 días
Compl.: 0%
Revoques, pañetes o frisos lisos para muros y techos
Comienzo: jue 11/03/27 Id.: 73
Fin: mié 28/04/27 Dur.: 35 días
Compl.: 0%
Estuco y pintura lavable acrílica (interior y fachadas)
Comienzo: lun 10/05/27 Id.: 77
Fin: mié 7/07/27 Dur.: 43 días
Compl.: 0%
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
Comienzo: jue 11/03/27 Id.: 72
Fin: mar 7/12/27 Dur.: 194 días
Compl.: 0%
Pisos y enchapes
Comienzo: jue 8/07/27 Id.: 81
Fin: lun 11/10/27 Dur.: 68 días
Compl.: 0%
Carpintería y cierres arquitectónicos
Comienzo: jue 23/09/27 Id.: 92
Fin: mié 27/10/27 Dur.: 25 días
Compl.: 0%
Aparatos y dotación fija
Comienzo: jue 28/10/27 Id.: 97
Fin: mar 7/12/27 Dur.: 29 días
Compl.: 0%
INSTALACIONES TÉCNICAS (MEP)
Comienzo: jue 17/12/26 Id.: 113
Fin: mar 14/12/27 Dur.: 259 días
Compl.: 0%
Sistema hidrosanitario
Comienzo: jue 17/12/26 Id.: 114
Fin: mié 10/03/27 Dur.: 60 días
Compl.: 0%
Entregas físicas de obra
Comienzo: mié 15/12/27 Id.: 142
Fin: jue 13/01/28 Dur.: 22 días
Compl.: 0%
CIERRE DEL PROYECTO
Comienzo: mié 8/12/27 Id.: 141
Fin: jue 13/01/28 Dur.: 27 días
Compl.: 0%
Documentación técnica y planos récord (As-Built)
Comienzo: mié 8/12/27 Id.: 148
Fin: vie 24/12/27 Dur.: 13 días
Compl.: 0%
Manuales, garantías y bitácoras
Comienzo: mié 8/12/27 Id.: 152
Fin: vie 31/12/27 Dur.: 18 días
Compl.: 0%
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
Comienzo: vie 14/01/28 Id.: 156
Fin: vie 11/02/28 Dur.: 21 días
Compl.: 0%
Liquidación contractual y cierre administrativo
Comienzo: vie 14/01/28 Id.: 157
Fin: vie 11/02/28 Dur.: 21 días
Compl.: 0%


Compactación de los llenos
Comienzo: mar 14/07/26
Duración: 3 días
Fin: jue 16/07/26
Límite de comienzo: mar 14/07/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 16/07/26
Armado e instalación de acero de refuerzo
Comienzo: vie 17/07/26
Duración: 2 días
Fin: lun 20/07/26
Límite de comienzo: vie 17/07/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 20/07/26
Instalación de formaleta (encofrado)
Comienzo: mar 21/07/26
Duración: 1 día
Fin: mar 21/07/26
Límite de comienzo: mar 21/07/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 21/07/26
Vaciado y vibrado de concreto
Comienzo: mié 22/07/26
Duración: 1 día
Fin: mié 22/07/26
Límite de comienzo: mié 22/07/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 22/07/26
Desencofrado y curado
Comienzo: jue 23/07/26
Duración: 1 día
Fin: jue 23/07/26
Límite de comienzo: jue 23/07/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 23/07/26
Armado e instalación de acero de refuerzo frente superior
Comienzo: vie 24/07/26
Duración: 11 días
Fin: vie 7/08/26
Límite de comienzo: vie 24/07/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 7/08/26
Instalación de formaleta (encofrado)
Comienzo: lun 3/08/26
Duración: 14 días
Fin: jue 20/08/26
Límite de comienzo: lun 3/08/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 20/08/26
Vaciado y vibrado de concreto
Comienzo: vie 21/08/26
Duración: 6 días
Fin: vie 28/08/26
Límite de comienzo: vie 21/08/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 28/08/26
Desencofrado y curado
Comienzo: lun 7/09/26
Duración: 5 días
Fin: vie 11/09/26
Límite de comienzo: lun 7/09/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 11/09/26
Suministro y acopio de vigas de madera
Comienzo: jue 10/09/26
Duración: 2 días
Fin: vie 11/09/26
Límite de comienzo: jue 10/09/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 11/09/26
Montaje e instalación de vigas de madera
Comienzo: lun 14/09/26
Duración: 1 día
Fin: lun 14/09/26
Límite de comienzo: lun 14/09/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 14/09/26
Estructura de losa maciza: encofrado, armado de acero y vaciado — Sótano (Basement)
Comienzo: mar 15/09/26
Duración: 11 días
Fin: mar 29/09/26
Límite de comienzo: mar 15/09/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 29/09/26
Estructura de losa maciza: encofrado, arma
Comienzo: mié 30/09/26
Límite de comienzo: mié 30/09/26


ado de acero y vaciado — Nivel 1 (Level_01)
uración: 13 días
Fin: vie 16/10/26
argen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 16/10/26
Estructura de losa maciza: encofrado, armado de acero y vaciado — Nivel 2 (Level_02)
Comienzo: lun 19/10/26
Duración: 14 días
Fin: jue 5/11/26
Límite de comienzo: lun 19/10/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 5/11/26
Estructura de losa maciza: encofrado, armado de acero y vaciado — Nivel 3 (Level_03)
Comienzo: vie 6/11/26
Duración: 14 días
Fin: mié 25/11/26
Límite de comienzo: vie 6/11/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 25/11/26
Estructura de losa maciza: encofrado, armado de acero y vaciado — Nivel 4 (Level_04)
Comienzo: jue 26/11/26
Duración: 14 días
Fin: mar 15/12/26
Límite de comienzo: jue 26/11/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 15/12/26
Escaleras prefabricadas ENTREPISO
Comienzo: jue 26/11/26
Duración: 2 días
Fin: vie 27/11/26
Límite de comienzo: jue 26/11/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 27/11/26
Izaje y montaje de escaleras de ENTREPISO
Comienzo: lun 30/11/26
Duración: 4 días
Fin: jue 3/12/26
Límite de comienzo: lun 30/11/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 3/12/26
Suministro, izaje y montaje de escaleras prefabricadas ACCESO
Comienzo: vie 4/12/26
Duración: 2 días
Fin: lun 7/12/26
Límite de comienzo: vie 4/12/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 7/12/26
Suministro, izaje y montaje de escaleras prefabricadas SOTANO
Comienzo: vie 4/12/26
Duración: 2 días
Fin: lun 7/12/26
Límite de comienzo: vie 4/12/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 7/12/26
Replanteo y marcación de ejes de muros
Comienzo: mar 8/12/26
Duración: 7 días
Fin: mié 16/12/26
Límite de comienzo: mar 8/12/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 16/12/26
Montaje instalación y sellado de paneles de madera -Sótano (Basement)
Comienzo: jue 17/12/26
Duración: 10 días
Fin: mié 30/12/26
Límite de comienzo: jue 17/12/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 30/12/26
Montaje, instalación y sellado de juntas de paneles de madera — Nivel 1 (Level_01)
Comienzo: jue 31/12/26
Duración: 11 días
Fin: jue 14/01/27
Límite de comienzo: jue 31/12/26
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 14/01/27
Montaje, instalación y sellado de juntas de paneles de madera — Nivel 2 (Level_02)
Comienzo: vie 15/01/27
Duración: 13 días
Fin: mar 2/02/27
Límite de comienzo: vie 15/01/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 2/02/27
Montaje, instalación y sellado de juntas de paneles de madera — Nivel 3 (Level_03)
Comienzo: mié 3/02/27
Duración: 13 días
Fin: vie
Límite de comienzo: mié 3/02/27
Margen de demora total: 0 días
Límite d


19/02/27
finalización: vie 19/02/27
Estructura de losa maciza: encofrado, armado de acero y vaciado — Nivel 4 (Level_04)
Comienzo: lun 22/02/27
Duración: 13 días
Fin: mié 10/03/27
Límite de comienzo: lun 22/02/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 10/03/27
Resane y sellado de regatas
Comienzo: mar 9/03/27
Duración: 2 días
Fin: mié 10/03/27
Límite de comienzo: mar 9/03/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 10/03/27
Preparación de superficies, humedecido y colocación de maestras
Comienzo: jue 11/03/27
Duración: 9 días
Fin: mar 23/03/27
Límite de comienzo: jue 11/03/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 23/03/27
Aplicación de pañete/revoque en muros y cielos
Comienzo: mié 24/03/27
Duración: 15 días
Fin: mar 13/04/27
Límite de comienzo: mié 24/03/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 13/04/27
Curado, afinado y resane de superficies
Comienzo: lun 19/04/27
Duración: 8 días
Fin: mié 28/04/27
Límite de comienzo: lun 19/04/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 28/04/27
Aplicación de estuco (dos manos) y lijado
Comienzo: lun 10/05/27
Duración: 15 días
Fin: vie 28/05/27
Límite de comienzo: lun 10/05/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 28/05/27
Aplicación de primera mano de pintura acrílica
Comienzo: mar 1/06/27
Duración: 14 días
Fin: vie 18/06/27
Límite de comienzo: mar 1/06/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 18/06/27
Aplicación de segunda mano de pintura y retoques
Comienzo: mar 22/06/27
Duración: 12 días
Fin: mié 7/07/27
Límite de comienzo: mar 22/06/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 7/07/27
Piso terminado: nivelación en mortero e instalación de cerámico — Sótano (Basement)
Comienzo: jue 8/07/27
Duración: 7 días
Fin: vie 16/07/27
Límite de comienzo: jue 8/07/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 16/07/27
Piso terminado: nivelación en mortero e instalación de cerámico — Nivel 1 (Level_01)
Comienzo: lun 19/07/27
Duración: 9 días
Fin: jue 29/07/27
Límite de comienzo: lun 19/07/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 29/07/27
Piso terminado: nivelación en mortero e instalación de cerámico — Nivel 2 (Level_02)
Comienzo: vie 30/07/27
Duración: 10 días
Fin: jue 12/08/27
Límite de comienzo: vie 30/07/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 12/08/27
Piso terminado: nivelación en mortero e instalación de cerámico — Nivel 3 (Level_03)
Comienzo: vie 13/08/27
Duración: 10 días
Fin: jue 26/08/27
Límite de comienzo: vie 13/08/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 26/08/27


Piso terminado: nivelación en mortero e instalación de cerámico — Nivel 4 (Level_04)
Comienzo: vie 27/08/27
Duración: 10 días
Fin: jue 9/09/27
Límite de comienzo: vie 27/08/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 9/09/27
Piso terminado: nivelación en mortero e instalación de cerámico — Cubierta (Roof)
Comienzo: vie 10/09/27
Duración: 7 días
Fin: lun 20/09/27
Límite de comienzo: vie 10/09/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 20/09/27
Emboquillado (fragüe), limpieza y remates
Comienzo: jue 23/09/27
Duración: 13 días
Fin: lun 11/10/27
Límite de comienzo: jue 23/09/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 11/10/27
Instalación de marcos, hojas y herrajes de puertas
Comienzo: mar 12/10/27
Duración: 7 días
Fin: mié 20/10/27
Límite de comienzo: mar 12/10/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 20/10/27
Instalación de ventanas y sellado perimetral
Comienzo: jue 21/10/27
Duración: 5 días
Fin: mié 27/10/27
Límite de comienzo: jue 21/10/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mié 27/10/27
Instalación de sanitarios
Comienzo: jue 28/10/27
Duración: 3 días
Fin: lun 1/11/27
Límite de comienzo: jue 28/10/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 1/11/27
Instalación de lavamanos
Comienzo: mar 2/11/27
Duración: 3 días
Fin: jue 4/11/27
Límite de comienzo: mar 2/11/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 4/11/27
Instalación de duchas y grifería
Comienzo: vie 5/11/27
Duración: 2 días
Fin: lun 8/11/27
Límite de comienzo: vie 5/11/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 8/11/27
Instalación de muebles de cocina
Comienzo: mar 9/11/27
Duración: 6 días
Fin: mar 16/11/27
Límite de comienzo: mar 9/11/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 16/11/27
Instalación de estanterías varias
Comienzo: mié 17/11/27
Duración: 2 días
Fin: jue 18/11/27
Límite de comienzo: mié 17/11/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 18/11/27
Instalación de lavaplatos de cocina
Comienzo: vie 19/11/27
Duración: 2 días
Fin: lun 22/11/27
Límite de comienzo: vie 19/11/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: lun 22/11/27
Instalación de muebles de baño
Comienzo: mar 23/11/27
Duración: 3 días
Fin: jue 25/11/27
Límite de comienzo: mar 23/11/27
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: jue 25/11/27
Instalación de sillas de sauna
Comienzo: vie 26/11/27
Límite de comienzo: vie 26/11/27



uración: 1 día Fin: vie 26/11/27
Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: vie 26/11/27

**Instalación de horno/calentador de sauna**
Comienzo: lun 29/11/27 Duración: 4 días Fin: jue 2/12/27
Límite de comienzo: lun 29/11/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: jue 2/12/27

**Instalación de tapas y rejillas de desagüe de baño**
Comienzo: vie 3/12/27 Duración: 1 día Fin: vie 3/12/27
Límite de comienzo: vie 3/12/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: vie 3/12/27

**Instalación de estanterías de habitaciones**
Comienzo: lun 6/12/27 Duración: 2 días Fin: mar 7/12/27
Límite de comienzo: lun 6/12/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mar 7/12/27

**Levantamiento en obra de cambios respecto al diseño**
Comienzo: mié 8/12/27 Duración: 4 días Fin: lun 13/12/27
Límite de comienzo: mié 8/12/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: lun 13/12/27

**Elaboración y actualización de planos As-Built**
Comienzo: mar 14/12/27 Duración: 4 días Fin: vie 17/12/27
Límite de comienzo: mar 14/12/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: vie 17/12/27

**Revisión y aprobación de planos As-Built por interventoría**
Comienzo: lun 20/12/27 Duración: 5 días Fin: vie 24/12/27
Límite de comienzo: lun 20/12/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: vie 24/12/27

**Consolidación, radicación y aprobación del dossier de calidad**
Comienzo: lun 27/12/27 Duración: 5 días Fin: vie 31/12/27
Límite de comienzo: lun 27/12/27 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: vie 31/12/27

**Recorrido de inspección conjunta y levantamiento de pendientes (punch list)**
Comienzo: lun 3/01/28 Duración: 3 días Fin: mié 5/01/28
Límite de comienzo: lun 3/01/28 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mié 5/01/28

**Corrección de pendientes y retoques finales**
Comienzo: jue 6/01/28 Duración: 4 días Fin: mar 11/01/28
Límite de comienzo: jue 6/01/28 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mar 11/01/28

**Limpieza final previa a la entrega y acta de recibo**
Comienzo: mié 12/01/28 Duración: 2 días Fin: jue 13/01/28
Límite de comienzo: mié 12/01/28 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: jue 13/01/28

**Conciliación de actas parciales y balance de obra ejecutada**
Comienzo: vie 14/01/28 Duración: 4 días Fin: mié 19/01/28
Límite de comienzo: vie 14/01/28 Margen de demora total: 0 días Límite de finalización: mié 19/01/28

**Liquidación de subcontratos y paz y salvo de proveedores**
Comienzo: jue 20/01/28 Duración: 5 días Fin: mi
Límite de comienzo: jue 20/01/28 Margen de demora total: 0 días Límite d


26/01/28
e finalización: mié 26/01/28
Cancelación de pólizas y trámite de garantía de estabilidad
Comienzo: jue 27/01/28
Duración: 4 días
Fin: mar 1/02/28
Límite de comienzo: jue 27/01/28
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 1/02/28
Elaboración y firma del acta de liquidación contractual
Comienzo: mié 2/02/28
Duración: 5 días
Fin: mar 8/02/28
Límite de comienzo: mié 2/02/28
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: mar 8/02/28
Archivo final y cierre administrativo del proyecto
Comienzo: mié 9/02/28
Duración: 3 días
Fin: vie 11/02/28
Límite de comienzo: mié 9/02/28
Margen de demora total: 0 días
Límite de finalización: vie 11/02/28

Proyecto: WBS PYP (Actualizado
Fecha: jue 6/08/26

| | |
|---|---|
| Tareas críticas | 🟥 |
| Tareas no críticas | ▭ |
| Hitos críticos | ⬢ |
| Hito | ⬡ |
| Tareas de resumen críticas | ▰ |
| Tareas de resumen | ▰ |
| Tareas críticas insertadas | ▱ |
| Tareas insertadas | ▱ |
| Tareas críticas y manuales | ⬬ |
| Tareas manuales | ⬭ |
| Tareas externas críticas | ▭ |
| Externas | ▭ |
| Resumen del proyecto | ▱ |
| Tareas críticas resaltadas | 🟨 |
| Tareas no críticas resaltadas | 🟨 |
